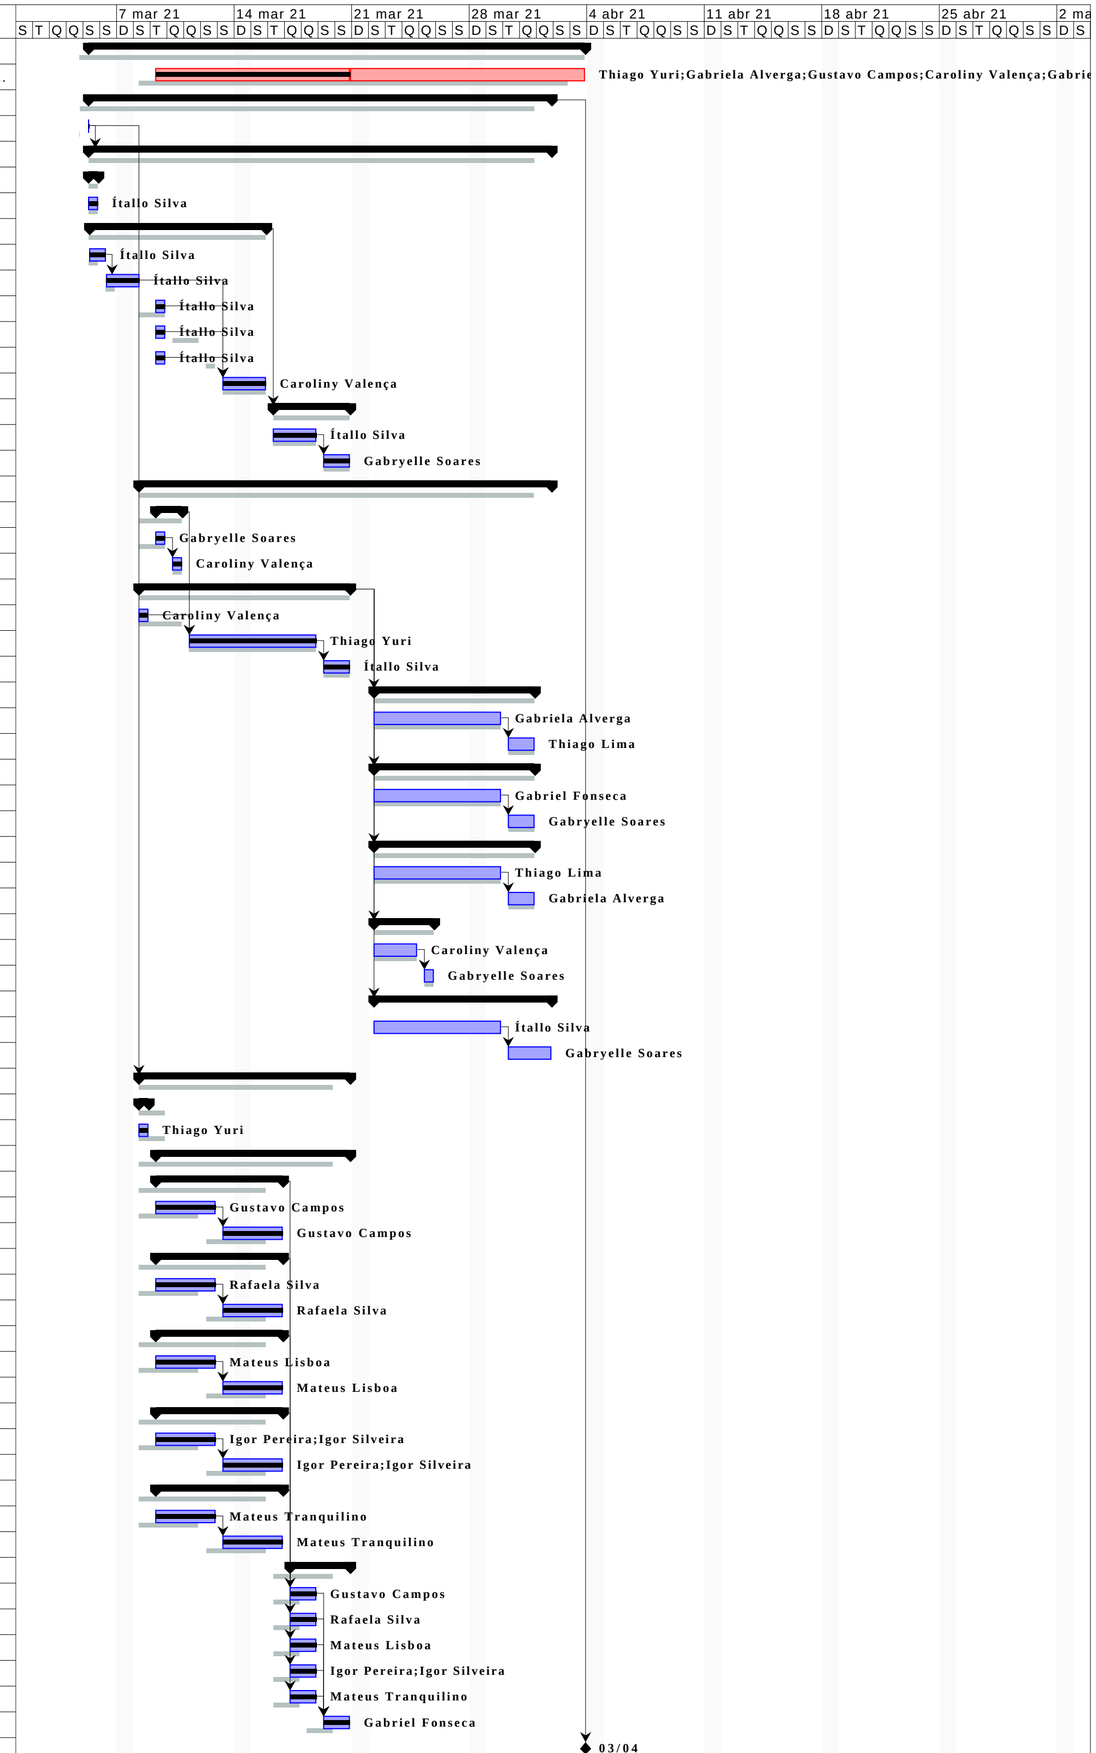		Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1		**Desenvolvimento do Projeto**	**26 dias**	**05/03/2021 08:00**	**03/04/2021 22:00**		
2		Estudo de tecnologias	23 dias	09/03/2021 08:00	03/04/2021 22:00		Thiago Yuri;Gabriela Alverga;Gustavo...
3		**2ª Entrega**	**24 dias**	**05/03/2021 08:00**	**01/04/2021 22:00**		
4	✔	Reunião de Planejamento	0,071 dias	05/03/2021 08:00	05/03/2021 09:00		
5		**Projeto Novo**	**24 dias**	**05/03/2021 08:00**	**01/04/2021 22:00**	**4**	
6	✔	**Seção 1 - Fase de Concepção**	**1 dia**	**05/03/2021 08:00**	**05/03/2021 22:00**		
7	✔	Descrição inicial do projeto	1 dia	05/03/2021 08:00	05/03/2021 22:00		Ítallo Silva
8	✔	**Seção 2 - Planejamento**	**8,929 dias**	**05/03/2021 09:00**	**15/03/2021 22:00**		
9	✔	Listagem dos riscos	1 dia	05/03/2021 09:00	06/03/2021 09:00		Ítallo Silva
10	✔	Estimativa inicial do tempo das atividades	1 dia	06/03/2021 09:00	08/03/2021 09:00	9	Ítallo Silva
11	✔	Estimativa do custo do projeto	1 dia	09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Ítallo Silva
12	✔	Listagem dos recursos	1 dia	09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Ítallo Silva
13	✔	Definição do modelo de comunicação	1 dia	09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Ítallo Silva
14	✔	Revisão da seção	2 dias	13/03/2021 08:00	15/03/2021 22:00	10;11;12;13	Caroliny Valença
15	✔	**Seção 3 - Processo**	**5 dias**	**16/03/2021 08:00**	**20/03/2021 22:00**	**8**	
16	✔	Discorrer sobre o processo utilizado	3 dias	16/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00		Ítallo Silva
17	✔	Revisão da seção	2 dias	19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	16	Gabryelle Soares
18		**Seção 4 - Engenharia de Requisitos**	**22 dias**	**08/03/2021 08:00**	**01/04/2021 22:00**		
19	✔	**Requisitos Não-Funcionais**	**2 dias**	**09/03/2021 08:00**	**10/03/2021 22:00**		
20	✔	Descrição dos Requisitos Não-Funcionais	1 dia	09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Gabryelle Soares
21	✔	Revisão dos RNF	1 dia	10/03/2021 08:00	10/03/2021 22:00	20	Caroliny Valença
22	✔	**Requisitos Funcionais**	**12 dias**	**08/03/2021 08:00**	**20/03/2021 22:00**		
23	✔	Listagem dos Requisitos Funcionais	1 dia	08/03/2021 08:00	08/03/2021 22:00		Caroliny Valença
24	✔	Especificação dos Requisitos Funcionais	7 dias	11/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	19;23	Thiago Yuri
25	✔	Revisão dos RF	2 dias	19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	24	Ítallo Silva
26		**Diagramas de Casos de Uso**	**9 dias**	**22/03/2021 08:00**	**31/03/2021 22:00**	**22**	
27		Elaboração dos diagramas de Casos de Uso	7 dias	22/03/2021 08:00	29/03/2021 22:00		Gabriela Alverga
28		Revisão dos Diagramas de Casos de Uso	2 dias	30/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	27	Thiago Lima
29		**API Rest**	**9 dias**	**22/03/2021 08:00**	**31/03/2021 22:00**	**22**	
30		Especificação da API Rest (Backend)	7 dias	22/03/2021 08:00	29/03/2021 22:00		Gabriel Fonseca
31		Revisão da Especificação da API Rest	2 dias	30/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	30	Gabryelle Soares
32		**Propotipação de Telas**	**9 dias**	**22/03/2021 08:00**	**31/03/2021 22:00**	**22**	
33		Elaboração da Prototipação de Telas	7 dias	22/03/2021 08:00	29/03/2021 22:00		Thiago Lima
34		Revisão dos Protótipos de Telas	2 dias	30/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	33	Gabriela Alverga
35		**Estimação do Esforço**	**4 dias**	**22/03/2021 08:00**	**25/03/2021 22:00**	**22**	
36		Estimativa de Esforço (Casos de Uso)	3 dias	22/03/2021 08:00	24/03/2021 22:00		Caroliny Valença
37		Revisão da Estimativa de Esforço	1 dia	25/03/2021 08:00	25/03/2021 22:00	36	Gabryelle Soares
38		**Diagrama Entidade-Relacionamento**	**10 dias**	**22/03/2021 08:00**	**01/04/2021 22:00**	**22**	
39		Elaboração do DER	7 dias	22/03/2021 08:00	29/03/2021 22:00		Ítallo Silva
40		Revisão do DER	3 dias	30/03/2021 08:00	01/04/2021 22:00	39	Gabryelle Soares
41	✔	**Projeto Real**	**12 dias**	**08/03/2021 08:00**	**20/03/2021 22:00**	**4**	
42	✔	**Seção 9 - Fase de Descrição**	**1 dia**	**08/03/2021 08:00**	**08/03/2021 22:00**		
43	✔	Descrição inicial do projeto	1 dia	08/03/2021 08:00	08/03/2021 22:00		Thiago Yuri
44	✔	**Seção 10 - Avaliação de Qualidade**	**11 dias**	**09/03/2021 08:00**	**20/03/2021 22:00**		
45	✔	**Análise de métricas**	**7 dias**	**09/03/2021 08:00**	**16/03/2021 22:00**		
46	✔	Estudo sobre a(s) ferramentas - plugin Metrics	4 dias	09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Gustavo Campos
47	✔	Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	46	Gustavo Campos
48	✔	**Bad smells**	**7 dias**	**09/03/2021 08:00**	**16/03/2021 22:00**		
49	✔	Estudo sobre a(s) ferramentas - SpotBugs, PMD	4 dias	09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Rafaela Silva
50	✔	Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	49	Rafaela Silva
51	✔	**Identificar problemas de estilo**	**7 dias**	**09/03/2021 08:00**	**16/03/2021 22:00**		
52	✔	Estudo sobre a(s) ferramentas - CheckStyle	4 dias	09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Mateus Lisboa
53	✔	Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	52	Mateus Lisboa
54	✔	**Análise estática**	**7 dias**	**09/03/2021 08:00**	**16/03/2021 22:00**		
55	✔	Estudo sobre a(s) ferramentas	4 dias	09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Igor Pereira;Igor Silveira
56	✔	Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	55	Igor Pereira;Igor Silveira
57	✔	**Análise da qualidade utilizando pirâmide**	**7 dias**	**09/03/2021 08:00**	**16/03/2021 22:00**		
58	✔	Estudo sobre a(s) ferramentas	4 dias	09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Mateus Tranquilino
59	✔	Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	58	Mateus Tranquilino
60	✔	**Relatório**	**4 dias**	**17/03/2021 08:00**	**20/03/2021 22:00**		
61	✔	Inclusão dos resultados e conclusões da análise...	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	45	Gustavo Campos
62	✔	Inclusão dos resultados e conclusões dos bad s...	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	48	Rafaela Silva
63	✔	Inclusão dos resultados e conclusões da análise...	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	51	Mateus Lisboa
64	✔	Inclusão dos resultados e conclusões da análise...	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	54	Igor Pereira;Igor Silveira
65	✔	Inclusão dos resultados e conclusões da análise...	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	57	Mateus Tranquilino
66	✔	Revisão do relatório	2 dias	19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	61;62;63;64;65	Gabriel Fonseca
67		Entrega da 2ª Parte	0 dias	03/04/2021 22:00	03/04/2021 22:00	3
